


第25回 松川町リニア中央新幹線 建設工事対策委員会

令和5年(2023年)3月27日

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所
中央新幹線長野工事事務所(大鹿分室)

- ① 大鹿村内リニア工事進捗状況
- ② 発生土運搬車両の運行状況
- ③ 環境測定の結果
- ④ その他

大鹿村の工事進捗状況

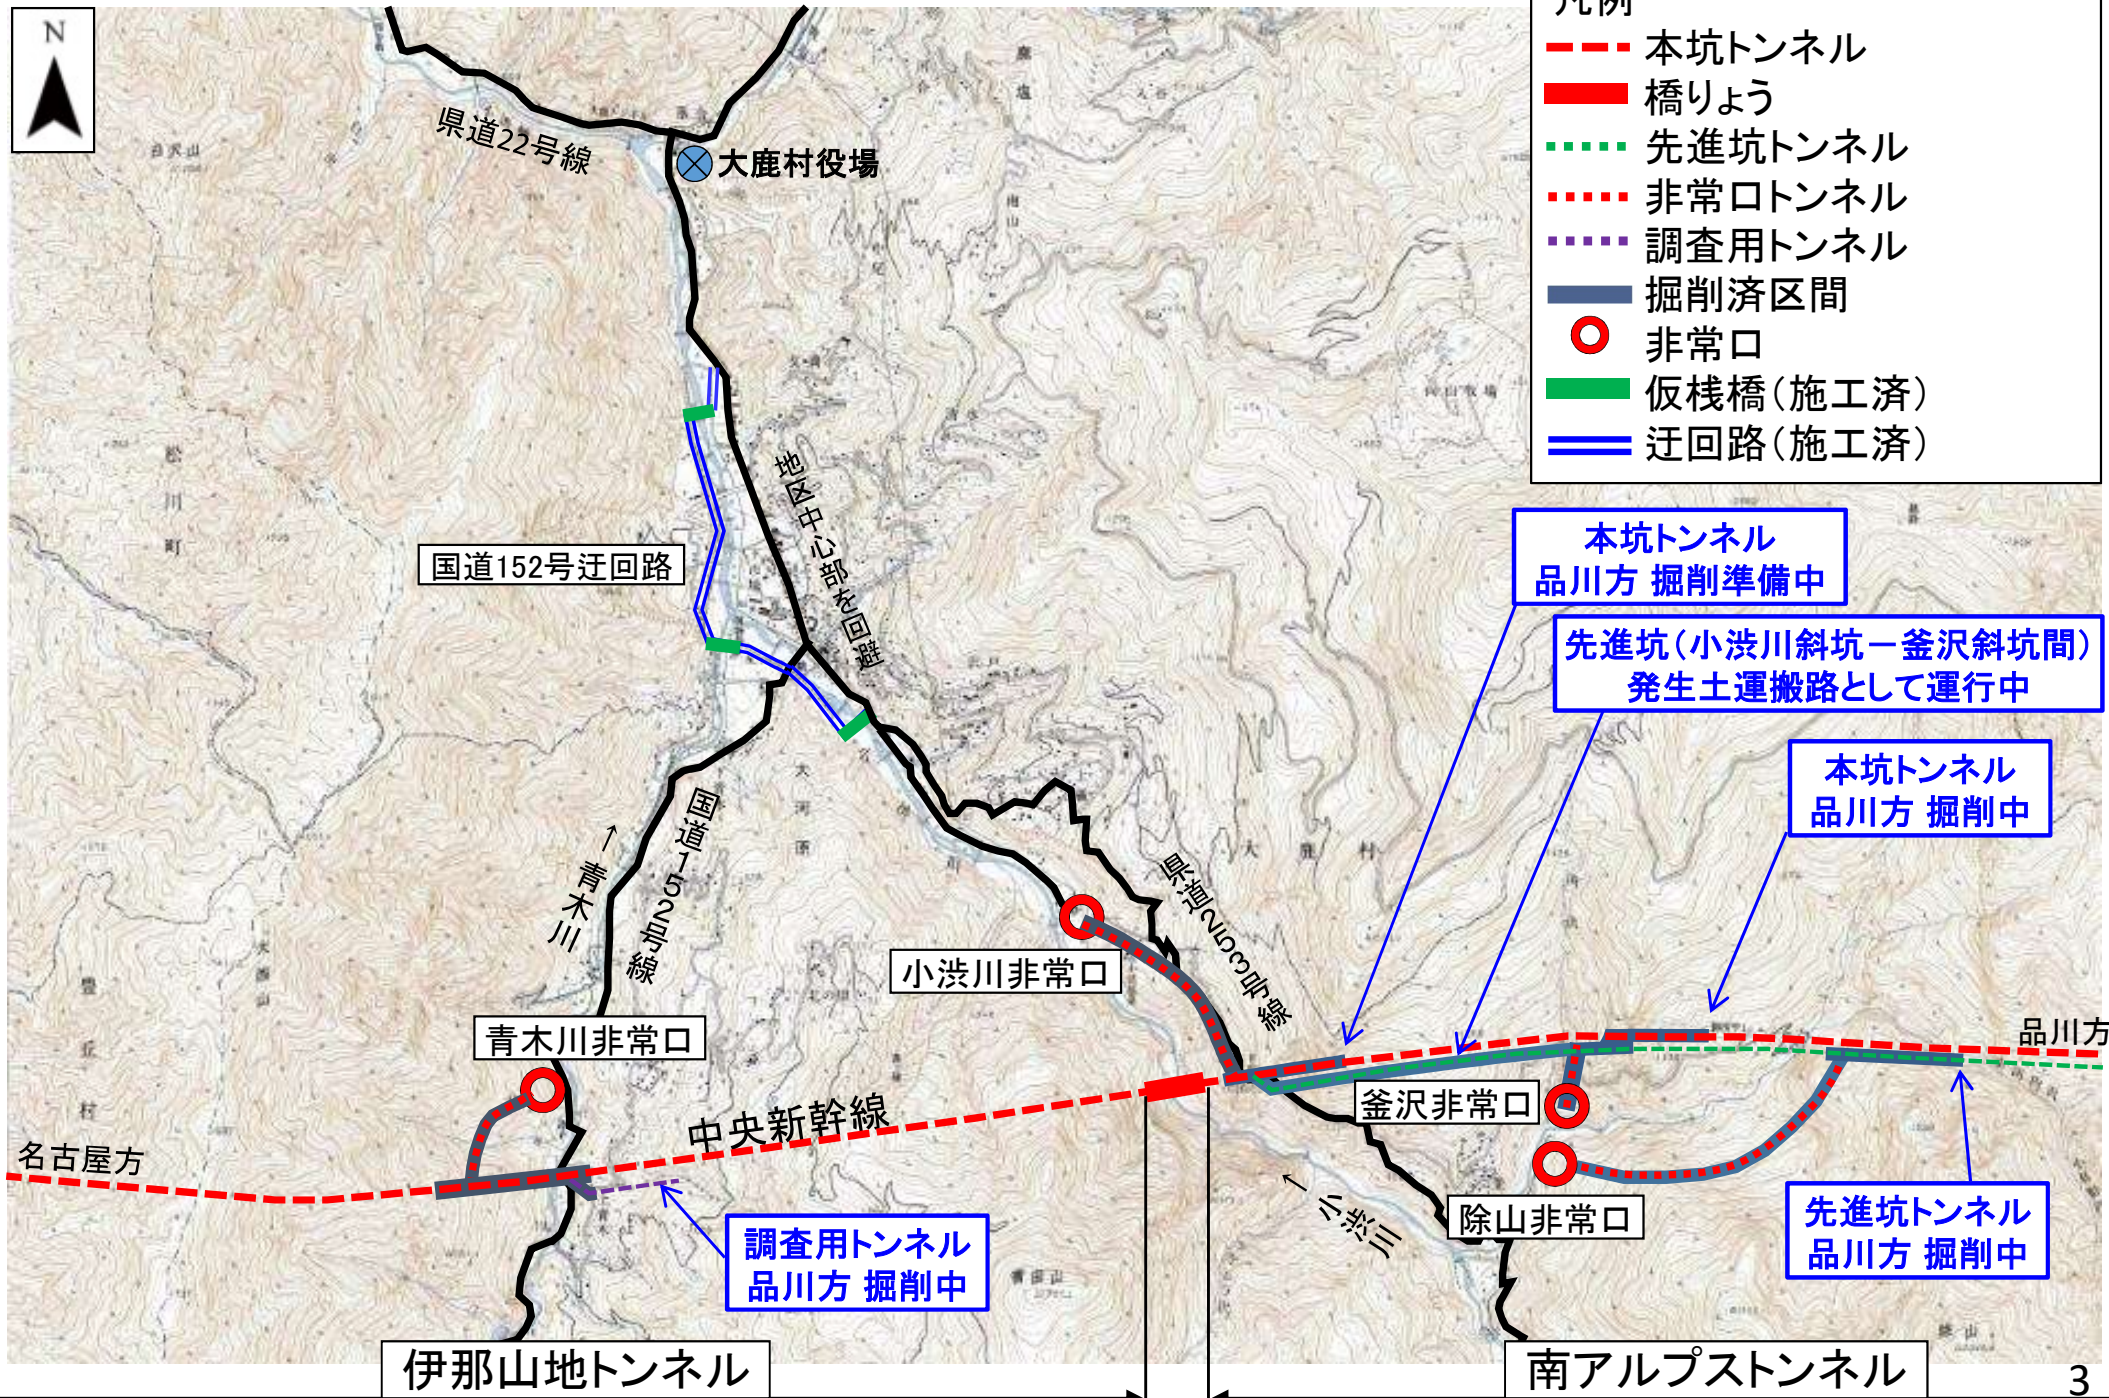

大鹿村の工事進捗状況

20230327 松川町
第25回対策委員会資料

本坑トンネル(名古屋方) 坑内状況(3月3日時点)



除山非常口 施工状況(3月2日時点)



釜沢非常口 施工状況(3月2日時点)




青木川調査用トンネル 施工状況(3月3日時点)



- ① 大鹿村内リニア工事進捗状況
- ② 発生土運搬車両の運行状況
- ③ 環境測定の結果
- ④ その他

【実績】発生土運搬車両台数


令和5年1月～3月の日平均

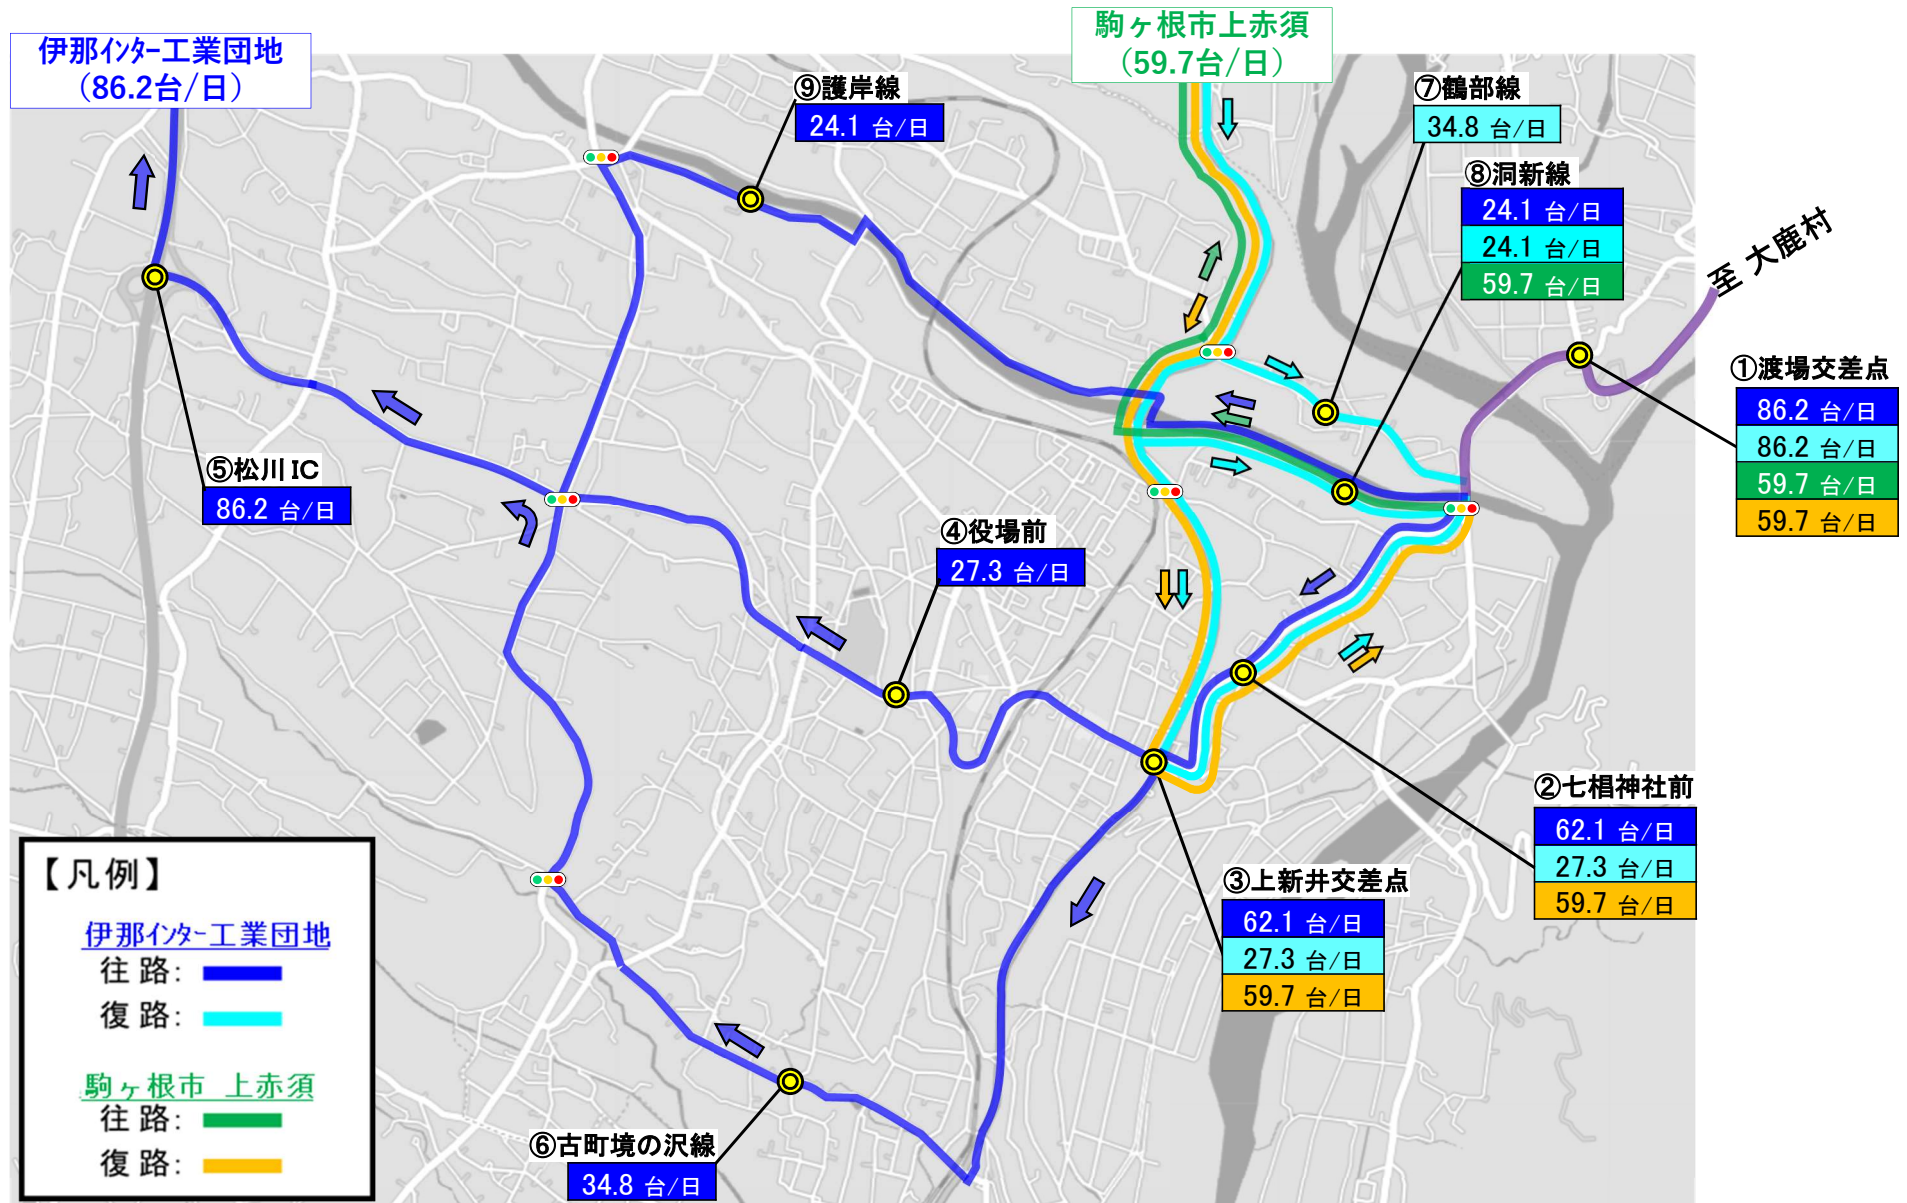

※ 上赤須への運搬は、令和5年2月最終週に完了しました
 ※ 「日平均」とは、期間中の延総台数を工事稼働日数で割り戻した数値です
 ※ 令和5年3月の台数は、3月15日までの実績台数としています

【予定】発生土運搬車両台数

令和5年4月～6月の日平均

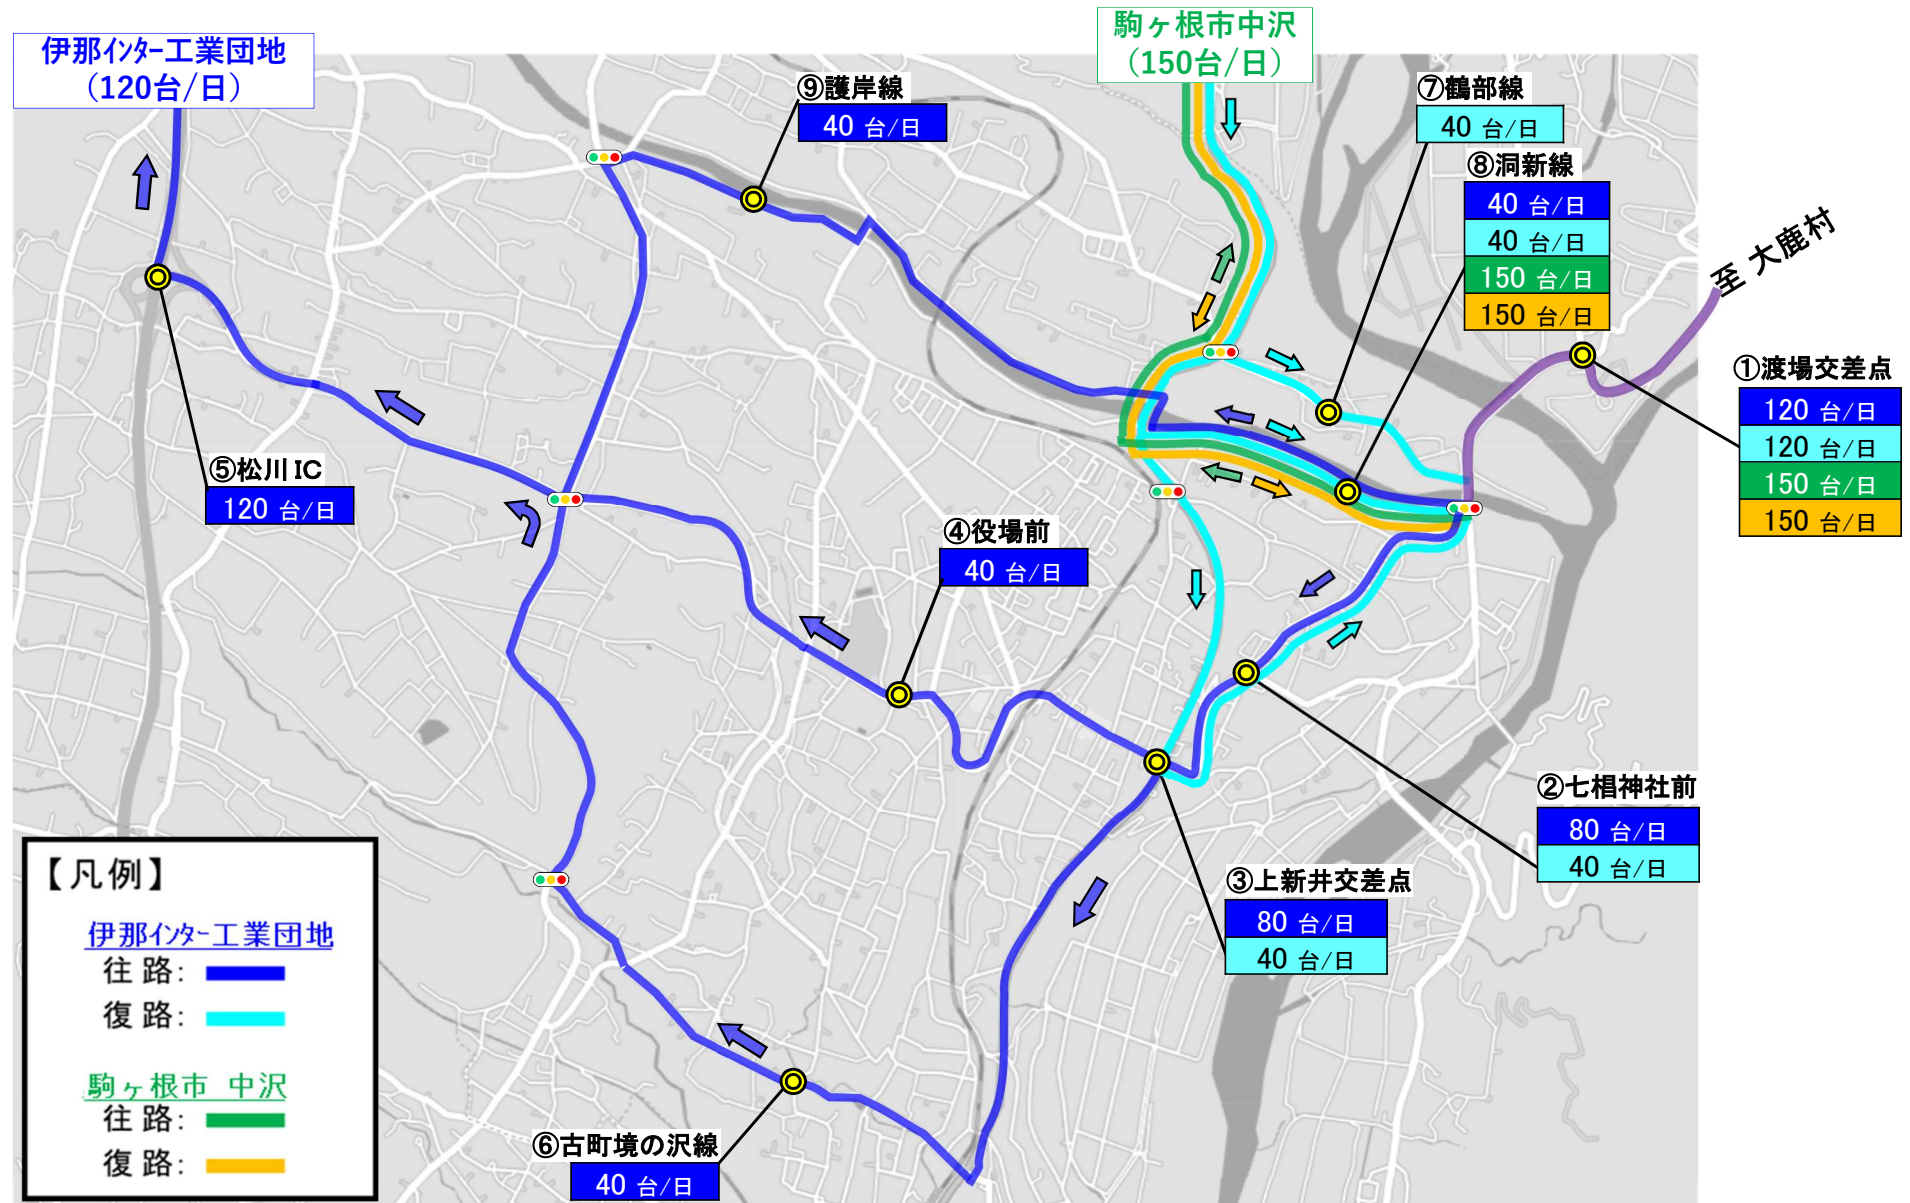

※ 中沢への運搬は、6月以降、準備が整い次第運搬を行う予定です
※ 「日平均」とは、期間中の延総台数を工事稼働日数で割り戻した数値です

【実績】発生土運搬車両台数

月別日平均 通行台数 (合計)		① 渡場 交差点	② 七椏 神社前 (往復)	③ 上新井 交差点	④ 松川町 役場前 (片道)	⑤ 松川IC (片道)	⑥ 古町 境の沢線 (片道)	⑦ 鶴部線 (片道)	⑧ 洞新線 (往復)	⑨ 護岸線 (片道)	
JR工事による 発生土運搬車両	実績	R4.12	308.6	161.4	161.4	28.1	87.9	38.8	38.8	108.4	21.0
		R5.1	306.7	157.0	157.0	25.6	86.2	38.5	38.5	111.3	22.0
		R5.2	283.8	145.2	145.2	21.9	68.4	27.8	27.8	110.9	18.7
		~R5.3.15	281.2	143.2	143.2	40.2	119.3	41.6	41.6	96.4	37.5
	予定	R5.4~R5.6	540.0	120.0	120.0	40.0	120.0	40.0	40.0	380.0	40.0

※ 「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日数で割り戻した数値です

※ 予定の台数については、期間中の予定延総台数を予定工事稼働日数で割り戻した「日平均」を記載しています

※ 表中の台数は、各道路や地点を通行する車両の合計台数を示しています

※ 上赤須への運搬は、令和5年2月最終週に完了しました

※ R5.4~R5.6の予定台数は、中沢への運搬開始後の数値です

- ① 大鹿村内リニア工事進捗状況
- ② 発生土運搬車両の運行状況
- ③ 環境測定の結果
- ④ その他

環境測定の結果

➤ 発生土運搬車両の通行期間中として、環境測定を実施しました

《騒音・振動》

測定地	測定期間	等価騒音レベル(LAeq)		振動レベルの80%レンジの上端値(L10)	
		測定結果【昼間】 (db)	環境基準【昼間】 (db)	測定結果【昼間】 (db)	要請限度【昼間】 (db)
七椏神社前	R3.10.6～10.7	68	70	43	65
	R4.7.25～7.26	68	70	44	65
	R5.2.8～2.9	68	70	44	65

《大気質》

測定地	測定期間	二酸化窒素(NO2)				浮遊粒子状物質			
		有効測定時間	期間 平均値 (ppm)	日平均値の 最高値 (ppm)	基準※	有効測定時間	期間 平均値 (mg/m ³)	日平均値の 最高値 (mg/m ³)	基準※
七椏神社前	R3.9.28～10.4	168h	0.004	0.005	日平均値の 年間98%値が 0.06ppm以下	168h	0.012	0.015	日平均値の 年間2%除外値が 0.10mg/m ³ 以下
	R4.7.29～8.4	168h	0.002	0.004		168h	0.015	0.020	
	R5.1.31～2.6	168h	0.006	0.009		168h	0.009	0.012	

(参考)二酸化窒素に係る環境基準の評価方法(長期的評価):
年間にわたる1日平均値である測定値につき、測定値の低い方から98%に相当する値(日平均値の年間98%値)が0.06ppm以下であること

(参考)浮遊粒子状物質に係る環境基準の評価方法(長期的評価):
日平均値の年間2%除外値が0.10mg/m³以下であること。ただし、1日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続しないこと。

※環境基準の評価方法(長期的評価)を記載した。

- ① 大鹿村内リニア工事進捗状況
- ② 発生土運搬車両の運行状況
- ③ 環境測定の結果
- ④ その他

- 中央小学校及び北小学校の児童を対象に、飯田警察署ご協力のもと町との共催で『交通安全教室』を開催しました。
- 交通安全教室では、大型車の特性(死角や内輪差など)を学んでもらい、地元・事業者双方の交通安全意識の醸成を図りました。



R5.1.26 交通安全教室(中央小)
内輪差講習の様子



R5.2.22 交通安全教室(北小)
死角体験の様子

- 当日は、警察署による自転車安全講習も実施しました。
- また、交通安全教室に合わせて、当社から中央新幹線事業やリニアの仕組みなどについても児童の皆さんへ紹介しました。



R5.1.26 交通安全教室(中央小)
自転車教育の様子



R5.2.22 交通安全教室(北小)
リニア事業紹介の様子

- 引き続き、工事の安全・環境の保全・地域住民の皆様と連携を重視して事業を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

- 今後の工事予定は、別紙「工事カレンダー」をご参照ください。
- 工事の状況や環境保全、安全対策などの取り組みについては、当社YouTubeチャンネルでも公開しています。是非ご覧ください。



<公式YouTube チャンネル>

リニア中央新幹線チャンネル【JR東海】



※上の二次元コードからもアクセスできます

JR東海

中央新幹線長野工事事務所（大鹿分室）

（住所）長野県下伊那郡大鹿村大字大河原2645-5

（電話）0265-39-2975

中央新幹線長野工事事務所

（住所）長野県飯田市元町5451

（電話）0265-38-6500

【受付】土・日・祝日、ゴールデンウィーク、お盆期間、年末年始(12月29日～1月3日)を除く平日の9時～17時

工事カレンダー(発生土運搬)

2023年

1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
1/1 日 <small>正月</small>		2/1 水		3/1 水		4/1 土		5/1 月		6/1 木		7/1 土		8/1 火		9/1 金		10/1 日		11/1 水		12/1 金	
1/2 月 <small>成人の日</small>		2/2 木		3/2 木		4/2 日		5/2 火		6/2 金		7/2 日		8/2 水		9/2 土		10/2 月		11/2 木		12/2 土	
1/3 火		2/3 金		3/3 金		4/3 月		5/3 水 <small>憲法記念日</small>		6/3 土		7/3 月		8/3 木		9/3 日		10/3 火		11/3 金 <small>文相の日</small>		12/3 日	
1/4 水		2/4 土		3/4 土		4/4 火		5/4 木 <small>みどりの日</small>		6/4 日		7/4 火		8/4 金		9/4 月		10/4 水		11/4 土		12/4 月	
1/5 木		2/5 日		3/5 日		4/5 水		5/5 金 <small>こどもの日</small>		6/5 月		7/5 水		8/5 土		9/5 火		10/5 木		11/5 日		12/5 火	
1/6 金		2/6 月		3/6 月		4/6 木		5/6 土		6/6 火		7/6 木		8/6 日		9/6 水		10/6 金		11/6 月		12/6 水	
1/7 土		2/7 火		3/7 火		4/7 金		5/7 日		6/7 水		7/7 金		8/7 月		9/7 木		10/7 土		11/7 火		12/7 木	
1/8 日		2/8 水		3/8 水		4/8 土		5/8 月		6/8 木		7/8 土		8/8 火		9/8 金		10/8 日		11/8 水		12/8 金	
1/9 月 <small>成人の日</small>		2/9 木		3/9 木		4/9 日		5/9 火		6/9 金		7/9 日		8/9 水		9/9 土		10/9 月 <small>スポーツの日</small>		11/9 木		12/9 土	
1/10 火		2/10 金		3/10 金		4/10 月		5/10 水		6/10 土		7/10 月		8/10 木		9/10 日		10/10 火		11/10 金		12/10 日	
1/11 水		2/11 土 <small>海軍記念日</small>		3/11 土		4/11 火		5/11 木		6/11 日		7/11 火		8/11 金 <small>山の日</small>		9/11 月		10/11 水		11/11 土		12/11 月	
1/12 木		2/12 日		3/12 日		4/12 水		5/12 金		6/12 月		7/12 水		8/12 土		9/12 火		10/12 木		11/12 日		12/12 火	
1/13 金		2/13 月		3/13 月		4/13 木		5/13 土		6/13 火		7/13 木		8/13 日		9/13 水		10/13 金		11/13 月		12/13 水	
1/14 土		2/14 火		3/14 火		4/14 金		5/14 日		6/14 水		7/14 金		8/14 月		9/14 木		10/14 土		11/14 火		12/14 木	
1/15 日		2/15 水		3/15 水		4/15 土		5/15 月		6/15 木		7/15 土		8/15 火		9/15 金		10/15 日		11/15 水		12/15 金	
1/16 月		2/16 木		3/16 木		4/16 日		5/16 火		6/16 金		7/16 日		8/16 水		9/16 土		10/16 月		11/16 木		12/16 土	
1/17 火		2/17 金		3/17 金		4/17 月		5/17 水		6/17 土		7/17 月 <small>海の日</small>		8/17 木		9/17 日		10/17 火		11/17 金		12/17 日	
1/18 水		2/18 土		3/18 土		4/18 火		5/18 木		6/18 日		7/18 火		8/18 金		9/18 月 <small>敬老の日</small>		10/18 水		11/18 土		12/18 月	
1/19 木		2/19 日		3/19 日		4/19 水		5/19 金		6/19 月		7/19 水		8/19 土		9/19 火		10/19 木		11/19 日		12/19 火	
1/20 金		2/20 月		3/20 月		4/20 木		5/20 土		6/20 火		7/20 木		8/20 日		9/20 水		10/20 金		11/20 月		12/20 水	
1/21 土		2/21 火		3/21 火 <small>恵比寿の日</small>		4/21 金		5/21 日		6/21 水		7/21 金		8/21 月		9/21 木		10/21 土		11/21 火		12/21 木	
1/22 日		2/22 水		3/22 水		4/22 土		5/22 月		6/22 木		7/22 土		8/22 火		9/22 金		10/22 日		11/22 水		12/22 金	
1/23 月		2/23 木 <small>天皇誕生日</small>		3/23 木		4/23 日		5/23 火		6/23 金		7/23 日		8/23 水		9/23 土 <small>秋分の日</small>		10/23 月		11/23 木 <small>勤王さまの日</small>		12/23 土	
1/24 火		2/24 金		3/24 金		4/24 月		5/24 水		6/24 土		7/24 月		8/24 木		9/24 日		10/24 火		11/24 金		12/24 日	
1/25 水		2/25 土		3/25 土		4/25 火		5/25 木		6/25 日		7/25 火		8/25 金		9/25 月		10/25 水		11/25 土		12/25 月	
1/26 木		2/26 日		3/26 日		4/26 水		5/26 金		6/26 月		7/26 水		8/26 土		9/26 火		10/26 木		11/26 日		12/26 火	
1/27 金		2/27 月		3/27 月		4/27 木		5/27 土		6/27 火		7/27 木		8/27 日		9/27 水		10/27 金		11/27 月		12/27 水	
1/28 土		2/28 火		3/28 火		4/28 金		5/28 日		6/28 水		7/28 金		8/28 月		9/28 木		10/28 土		11/28 火		12/28 木	
1/29 日				3/29 水		4/29 土 <small>恵比寿の日</small>		5/29 月		6/29 木		7/29 土		8/29 火		9/29 金		10/29 日		11/29 水		12/29 金	
1/30 月				3/30 木		4/30 日		5/30 火		6/30 金		7/30 日		8/30 水		9/30 土		10/30 月		11/30 木		12/30 土	
1/31 火				3/31 金				5/31 水				7/31 月		8/31 木				10/31 火				12/31 日	

- ... 前回からの変更箇所
- ... 発生土運搬を行わない日
- ... 調整日
