

第22回 松川町リニア中央新幹線 建設工事対策委員会資料

令和4年(2022年)6月27日

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所
中央新幹線長野工事事務所(大鹿分室)

1


本日のご説明内容

- ① 大鹿村内リニア工事進捗状況
- ② 発生土運搬車両の運行状況
- ③ 7月以降の伊那インター工業団地への運行計画
- ④ 上赤須廃棄物置場跡地整備(駒ヶ根市)への運行計画

2

大鹿村の工事進捗状況

20220627 松川町
第22回対策委員会資料

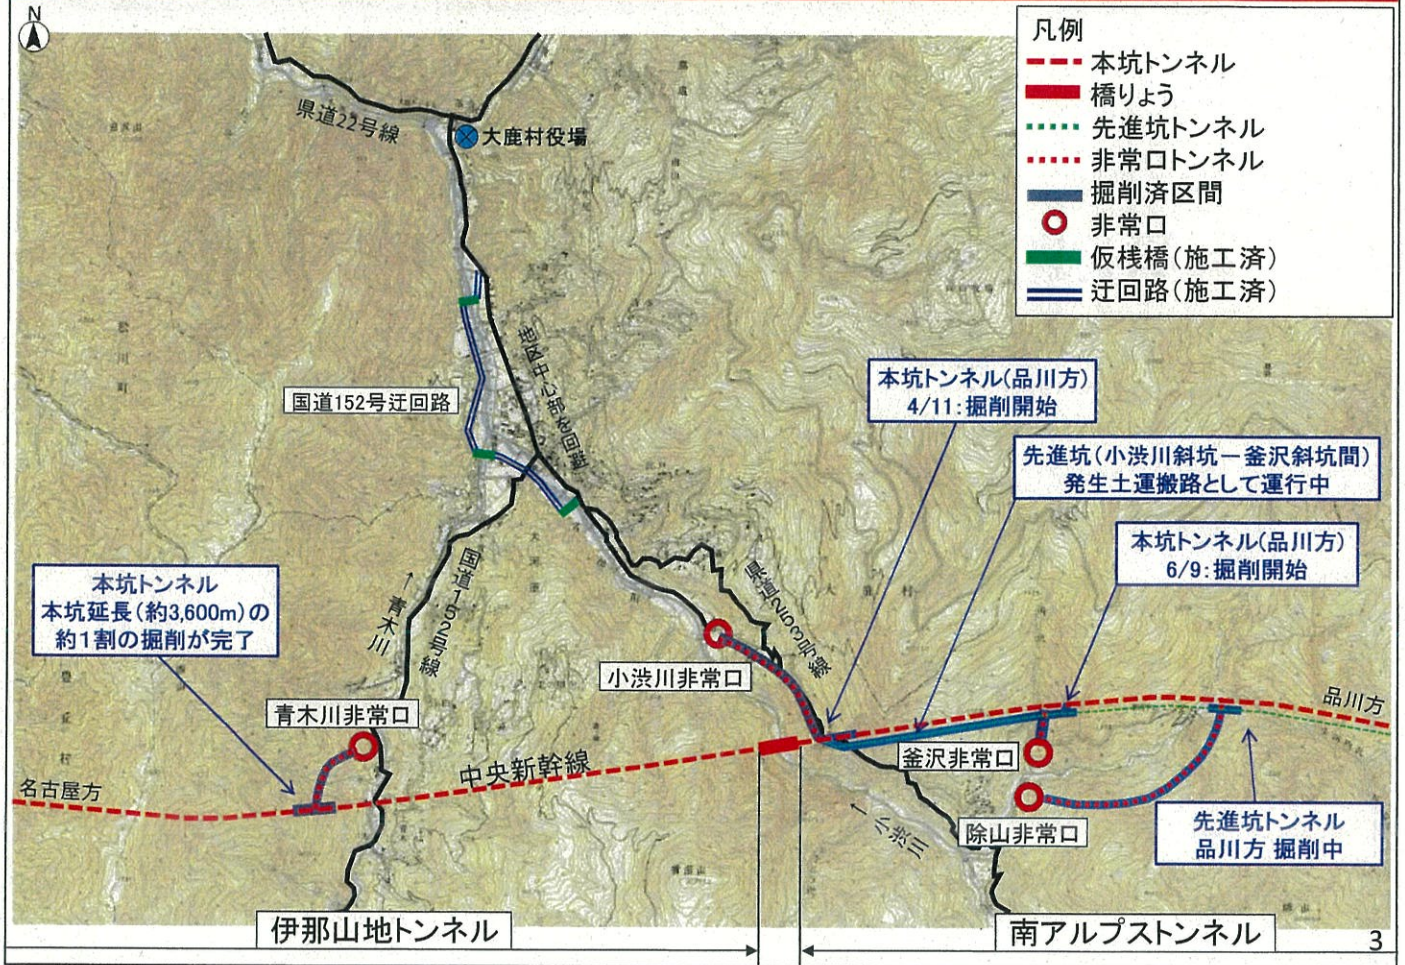

大鹿村の工事進捗状況

20220627 松川町
第22回対策委員会資料

本坑 掘削状況(6月6日時点)



除山非常口 施工状況(6月13日時点)



釜沢非常口 施工状況(6月13日時点)




青木川本坑 施工状況(6月15日時点)



【実績】発生土運搬車両台数

20220627 松川町
第22回対策委員会資料

令和4年4月～令和4年6月10日(約2.5箇月間)の日平均

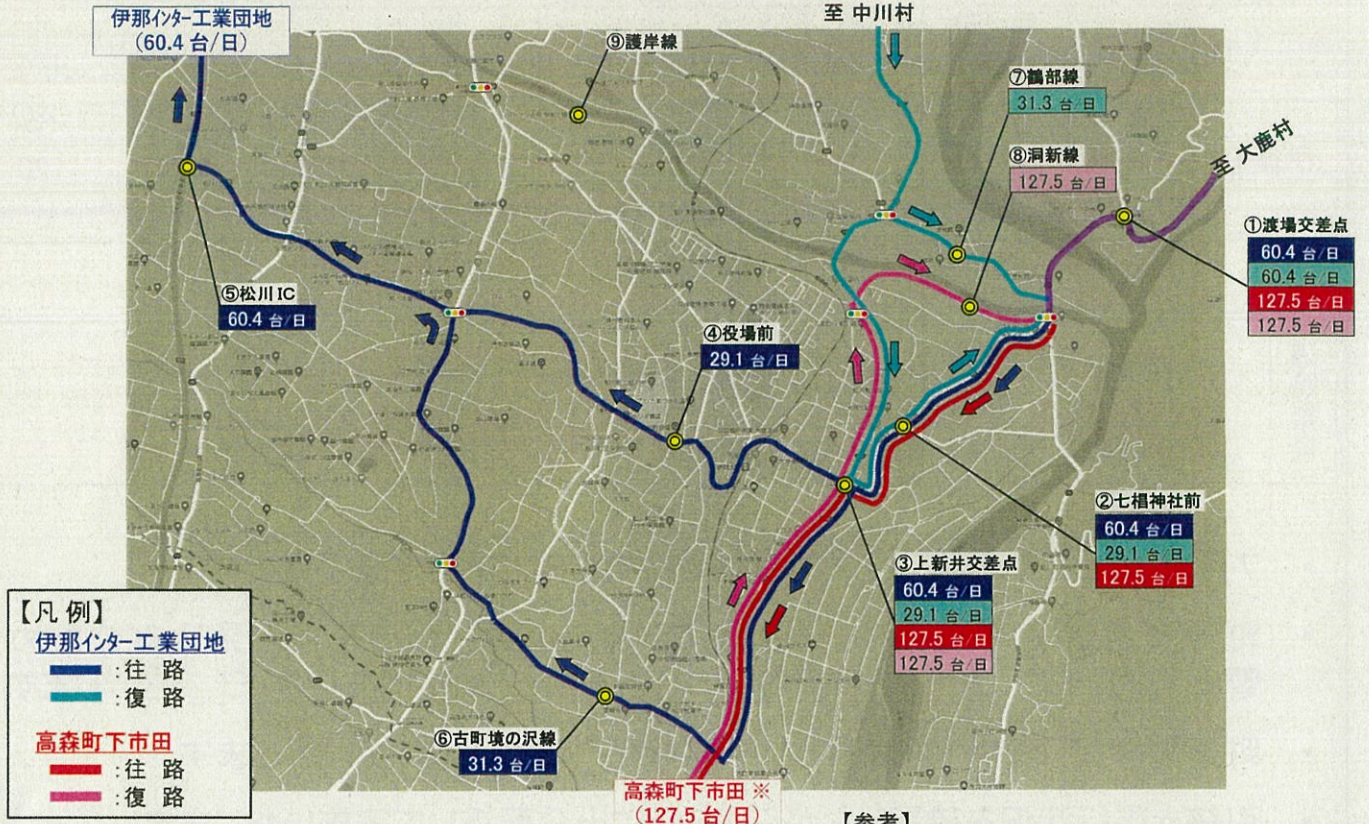

※「日平均」とは、期間中の延総台数を工事稼働日数で割り戻した数値です

【参考】
※ 下市田産業用地整備
高森町により発生土運搬を実施中

【実績】発生土運搬車両台数

20220627 松川町
第22回対策委員会資料

月別日平均 通行台数 (合計)		① 渡場 交差点	② 七福 神社前 (往復)	③ 上新井 交差点	④ 松川町 役場前 (片道)	⑤ 松川IC (片道)	⑥ 古町 境の沢線 (片道)	⑦ 鶴部線 (片道)	⑧ 洞新線 (片道)	⑨ 護岸線 (片道)	
JR工事による 発生土運搬車両	実績	R4.3	80.1	59.6	59.6	19.6	40.1	20.5	20.5	0.0	0.0
		R4.4	97.3	77.3	77.3	28.6	48.7	20.1	20.1	0.0	0.0
		R4.5	131.9	93.4	93.4	27.5	66.0	38.5	38.5	0.0	0.0
		~R4.6.10	133.4	98.1	98.1	31.4	66.7	35.4	35.4	0.0	0.0
	予定	R4.7~R4.9	240.0	160.0	160.0	60.0	120.0	60.0	40.0	40.0	0.0
【参考】 高森町への 発生土運搬車両	実績	R4.3	228.1	114.1	228.1	-	-	-	-	114.1	-
		R4.4	248.6	124.3	248.6	-	-	-	-	124.3	-
		R4.5	281.2	140.6	281.2	-	-	-	-	140.6	-
		~R4.6.10	234.9	117.5	234.9	-	-	-	-	117.5	-
	予定	R4.7~R4.9	300.0	150.0	300.0	-	-	-	-	150.0	-
R4.7~R4.9 発生土運搬総台数		540.0	310.0	460.0	60.0	120.0	60.0	40.0	190.0	0.0	

※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日数で割り戻した数値です

※ 予定の台数については、期間中の予定延総台数を予定工事稼働日数で割り戻した「日平均」を記載しています

※ 表中の台数は、各道路や地点を通行する車両の合計台数を示しています

発生土活用先 (日あたり片道)	時期	令和3年度				令和4年度			
		1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
伊那インター工業団地拡張	() : 当初計画			(50)	(50)	(120)	(120)	(120)	(120)
				18	27	80	120	120	120

暫定期間

道路整備	町道洞新線 町道護岸線	▼拡幅・新設		運行ルート 切替 9月下旬(予定)
		(設計・用地・工事発注)	(設計・用地・工事発注)	

- 7月以降は当初の予定どおり平均120台/日で運行する予定です
- 町道整備の完了時期が、当初想定(今年夏頃)から遅れる見込みのため、暫定計画として、**整備完了までの間は1路線あたり平均60台/日で運行します**
- 町道整備完了後、1路線あたり平均40台/日(3路線)で運行します
- 引き続き運行状況を確認しながら、安全に十分配慮して実施いたします

町道整備完了までの暫定計画


暫定期間：7月上旬～9月下旬(予定)






上赤須廃棄物置場跡地整備(駒ヶ根市)

具体的な運行計画は以下のとおりとなりましたのでお知らせします

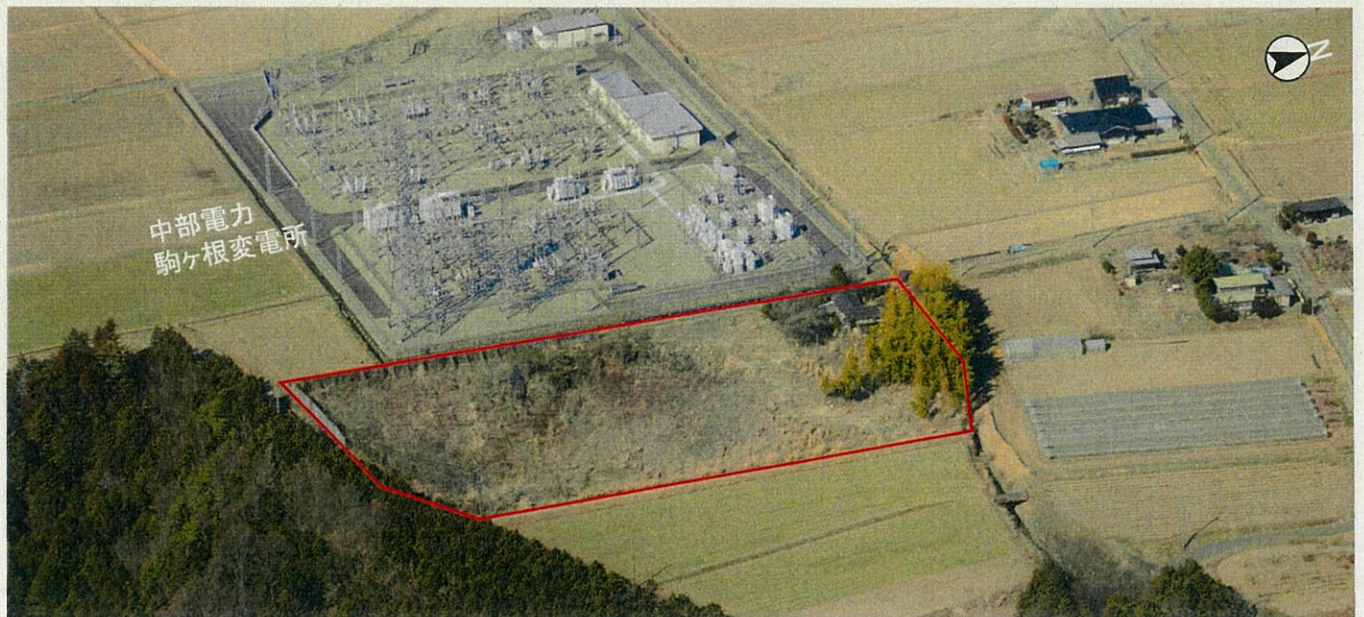

- ・ 運搬期間 … 令和4年11月 ～ 令和5年2月
- ・ 運搬台数 … 片道 約80台/日

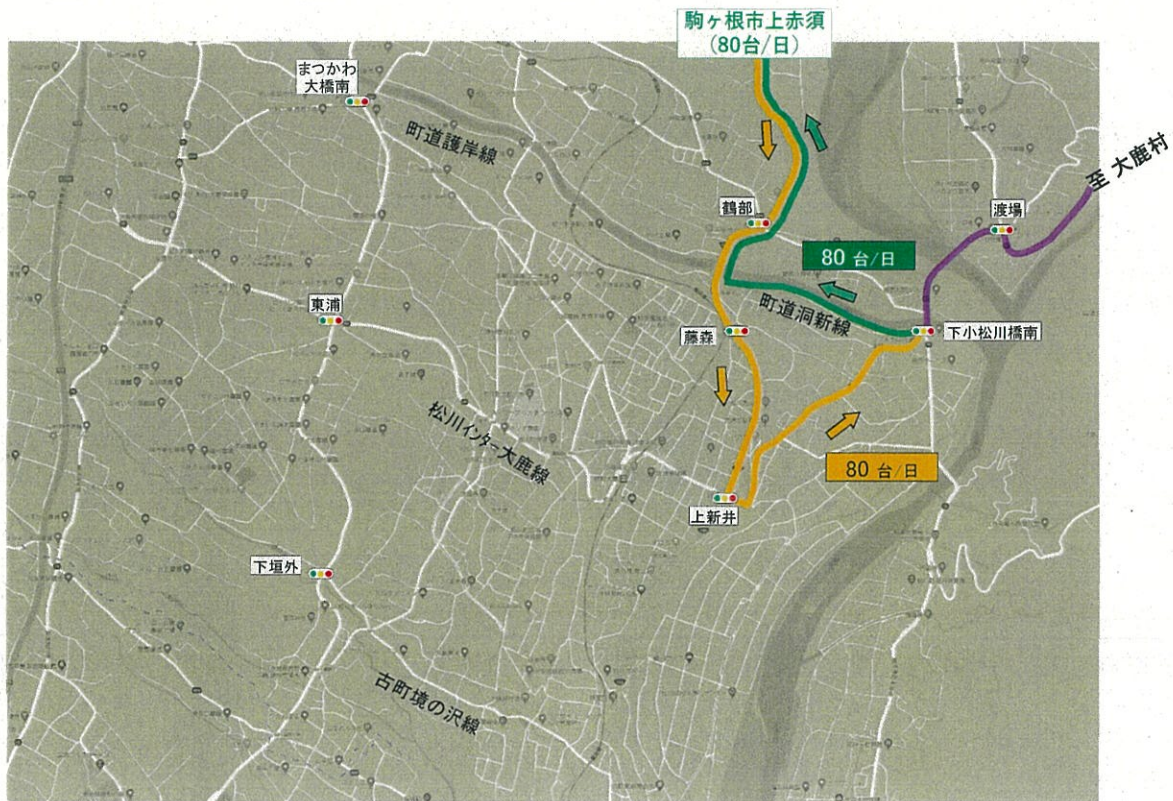

※下市田の運搬^{ふくそう}と輻輳する期間は、両工区合計150台/日を上回らないよう調整します

11

工事カレンダー・お問い合わせ先

- 今後の工事予定は、別紙「工事カレンダー」を参照

J R 東海

中央新幹線長野工事事務所 (大鹿分室)

(住所) 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原2645-5

(電話) 0265-39-2975

中央新幹線長野工事事務所

(住所) 長野県飯田市元町5451

(電話) 0265-38-6500

【受付：土・日・祝日・年末年始を除く平日9時～17時】

工事カレンダー(発生土運搬)

2022年

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1/1 土 元日	2/1 火	3/1 火	4/1 金	5/1 日 5/1 日	6/1 水	7/1 金	8/1 月	9/1 木	10/1 土	11/1 火	12/1 木
1/2 日	2/2 水	3/2 水	4/2 土	5/2 月	6/2 木	7/2 土	8/2 火	9/2 金	10/2 日	11/2 水	12/2 金
1/3 月	2/3 木	3/3 木	4/3 日 4/3 日	5/3 火 5/3 火 憲法記念日	6/3 金	7/3 日 7/3 日	8/3 水	9/3 土	10/3 月	11/3 木 文化の日	12/3 土
1/4 火	2/4 金	3/4 金	4/4 月	5/4 水 5/4 水 みどりの日	6/4 土	7/4 月	8/4 木	9/4 日 9/4 日	10/4 火	11/4 金	12/4 日 12/4 日
1/5 水	2/5 土	3/5 土	4/5 火	5/5 木 5/5 木 こどもの日	6/5 日 6/5 日	7/5 火	8/5 金	9/5 月	10/5 水	11/5 土	12/5 月
1/6 木	2/6 日 2/6 日	3/6 日 3/6 日	4/6 水	5/6 金 5/6 金 こどもの日	6/6 月	7/6 水	8/6 土	9/6 火	10/6 木	11/6 日 11/6 日	12/6 火
1/7 金	2/7 月	3/7 月	4/7 木	5/7 土 5/7 土	6/7 火	7/7 木	8/7 日	9/7 水	10/7 金	11/7 月	12/7 水
1/8 土	2/8 火	3/8 火	4/8 金	5/8 日 5/8 日	6/8 水	7/8 金	8/8 月	9/8 木	10/8 土	11/8 火	12/8 木
1/9 日	2/9 水	3/9 水	4/9 土	5/9 月	6/9 木	7/9 土	8/9 火	9/9 金	10/9 日 10/9 日	11/9 水	12/9 金
1/10 月 成人の日	2/10 木	3/10 木	4/10 日 4/10 日	5/10 火	6/10 金	7/10 日 7/10 日	8/10 水	9/10 土	10/10 月 スポーツの日	11/10 木	12/10 土
1/11 火	2/11 金 建国記念の日	3/11 金	4/11 月	5/11 水	6/11 土 6/11 土	7/11 月	8/11 木 山の日	9/11 日 9/11 日	10/11 火	11/11 金	12/11 日 12/11 日
1/12 水	2/12 土	3/12 土	4/12 火	5/12 木	6/12 日 6/12 日	7/12 火	8/12 金	9/12 月	10/12 水	11/12 土	12/12 月
1/13 木	2/13 日 2/13 日	3/13 日 3/13 日	4/13 水	5/13 金	6/13 月	7/13 水	8/13 土	9/13 火	10/13 木	11/13 日 11/13 日	12/13 火
1/14 金	2/14 月	3/14 月	4/14 木	5/14 土	6/14 火	7/14 木	8/14 日	9/14 水	10/14 金	11/14 月	12/14 水
1/15 土	2/15 火	3/15 火	4/15 金	5/15 日 5/15 日	6/15 水	7/15 金	8/15 月	9/15 木	10/15 土	11/15 火	12/15 木
1/16 日	2/16 水	3/16 水	4/16 土	5/16 月	6/16 木	7/16 土	8/16 火	9/16 金	10/16 日 10/16 日	11/16 水	12/16 金
1/17 月	2/17 木	3/17 木	4/17 日 4/17 日	5/17 火	6/17 金	7/17 日 7/17 日 海の日	8/17 水	9/17 土	10/17 月	11/17 木	12/17 土
1/18 火	2/18 金	3/18 金	4/18 月	5/18 水	6/18 土 6/18 土	7/18 月	8/18 木	9/18 日 9/18 日 敬老の日	10/18 火	11/18 金	12/18 日 12/18 日
1/19 水	2/19 土	3/19 土	4/19 火	5/19 木	6/19 日 6/19 日	7/19 火	8/19 金	9/19 月 9/19 月 敬老の日	10/19 水	11/19 土	12/19 月
1/20 木	2/20 日 2/20 日	3/20 日 3/20 日	4/20 水	5/20 金	6/20 月	7/20 水	8/20 土	9/20 火	10/20 木	11/20 日 11/20 日	12/20 火
1/21 金	2/21 月	3/21 月 春分の日	4/21 木	5/21 土 5/21 土	6/21 火	7/21 木	8/21 日	9/21 水	10/21 金	11/21 月	12/21 水
1/22 土	2/22 火	3/22 火	4/22 金	5/22 日 5/22 日	6/22 水	7/22 土	8/22 月	9/22 木	10/22 土	11/22 火	12/22 木
1/23 日 天皇誕生日	2/23 水	3/23 水	4/23 土	5/23 月	6/23 木	7/23 日 7/23 日	8/23 火	9/23 金 9/23 金 秋分の日	10/23 日 10/23 日	11/23 水 11/23 水 勤労感謝の日	12/23 金
1/24 月	2/24 木	3/24 木	4/24 日 4/24 日	5/24 火	6/24 金	7/24 日 7/24 日	8/24 水	9/24 土	10/24 月	11/24 木	12/24 土
1/25 火	2/25 金	3/25 金	4/25 月	5/25 水	6/25 土	7/25 月	8/25 木	9/25 日 9/25 日	10/25 火	11/25 金	12/25 日 12/25 日
1/26 水	2/26 土	3/26 土	4/26 火	5/26 木	6/26 日 6/26 日	7/26 火	8/26 金	9/26 月	10/26 水	11/26 土	12/26 月
1/27 木	2/27 日 2/27 日	3/27 日 3/27 日	4/27 水	5/27 金	6/27 月	7/27 水	8/27 土	9/27 火	10/27 木	11/27 日 11/27 日	12/27 火
1/28 金	2/28 月	3/28 月	4/28 木	5/28 土	6/28 火	7/28 木	8/28 日	9/28 水	10/28 金	11/28 月	12/28 水
1/29 土		3/29 火	4/29 金 4/29 金 恵比寿の日	5/29 日 5/29 日	6/29 水	7/29 金	8/29 月	9/29 木	10/29 土	11/29 火	12/29 木
1/30 日		3/30 水	4/30 土	5/30 月	6/30 木	7/30 土	8/30 火	9/30 金	10/30 日 10/30 日	11/30 水	12/30 金
1/31 月		3/31 木		5/31 火		7/31 日 7/31 日	8/31 水		10/31 月		12/31 土

... 前回からの変更箇所
... 発生土運搬を行わない日
△ 台数調整日(減便)

